

Bogotá D.C., Octubre 24 de 2025

Doctora

Martha Rocío Caldas Niño

Directora Técnica

Empresa Férrea Regional S.A.S.

Avenida Calle 26 No. 57-83 Edificio CEMSA Piso 7

Bogotá, D.C, Colombia

Asunto: Propuesta Comercial actualizada Convenio de asesoría técnica - Proyecto Tren de Zipaquirá

Estimada Martha:


Como parte del proceso para la suscripción del convenio de asesoría técnica para la estructuración integral de una Transacción PPP del proyecto del Tren de Zipaquirá, y en respuesta al Documento 2025103200023021, por medio de la presente nos permitimos adjuntar la propuesta comercial actualizada y anexo con las actividades y la justificación del presupuesto.

Es importante resaltar que esta propuesta comercial no es vinculante y, en caso de considerarse viable, se deberá suscribir el correspondiente convenio que formalice las obligaciones entre las partes.

Quedamos a su disposición para atender sus inquietudes y observaciones.

Agradeciendo su atención e interés,

Cordialmente,



Poldy Paola Osorio

Senior Investment Officer

Latin America and the Caribbean

Infrastructure Advisory in Public-Private Partnerships

Asesoría Técnica para la estructuración de una transacción PPP para el proyecto Tren de Zipaquirá

Actividades y Justificación del Presupuesto

El presente documento se realiza para beneficio de la Empresa Férrea Regional (EFR) y de la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca (SMC). Este es un documento meramente informativo y no vinculante. En caso de discrepancia, prevalecerá el Convenio de Asesoría Técnica (el “Convenio”) suscrito entre las partes.

1. Actividades a realizar por el Consultor:

Los clientes encuentran en IFC el gerente directo de los servicios de estructuración. IFC no delega ni subcontrata esta función que es la fuente de su experiencia de primera mano. Dado lo anterior, IFC como estructurador integral, pone a disposición de sus clientes, personal propio y consultores multidisciplinarios, tanto locales como internacionales, para velar por la integración de los diferentes productos de la estructuración del Proyecto, realiza un filtro de calidad a los entregables de los consultores, coordina las diferentes disciplinas y traer las mejores prácticas internacionales en diferentes materias aplicables al Proyecto.

IFC deberá cumplir con todas las actividades establecidas en el Alcance de la Consultoría contenido en el Convenio y sus Anexos. A continuación, se presenta un resumen general de las actividades:

- 1. Gestión Técnica:** Llevar a cabo los procesos y actividades necesarias para la actualización y/o realización de los estudios y la estructuración técnica del corredor a concesionar, de acuerdo con la normatividad vigente para este tipo de estudios.
- 2. Gestión Socioambiental:** Incluye la identificación de brechas entre la legislación local y las normas de desempeño de IFC, análisis socioambiental sobre el Proyecto, identificación y cuantificación de posibles contingencias a nivel socioambiental que puedan derivarse de la ejecución del Proyecto. IFC estructurará el Proyecto, basado en la normas locales y lineamientos de las Normas de Desempeño de IFC.
- 3. Gestión Predial y reasentamiento:** Incluye la identificación de posibles contingencias a nivel predial, necesidades de programas de reasentamiento y compra de predios y sus costos asociados. IFC estructurará el Proyecto, basado en la normas locales y lineamientos de las Normas de Desempeño de IFC
- 4. Gestión de Presupuestos y Programación:** IFC desarrollará la información de ingeniería necesaria para estimar para los tramos o subtramos a ser estructurados, todas las estimaciones de costos, características, y programación de las diferentes etapas tanto para el corredor principal como para las vías complementarias.

5. Gestión Económica y Financiera: Definición de una estructura financiera para el corredor, que permitan maximizar los beneficios de la sociedad y de la Gobernación de Cundinamarca, según las mejores prácticas internacional y de bancabilidad. Se deberán presentar alternativas de financiación, el esquema y estimación inicial de plazo, la estructura de ingresos para el concesionario, proyecciones de tráfico y demanda. Esto incluye a su vez, la evaluación económica y diseño administración y cuantificación del impacto de los riesgos del Proyecto, así como sus posibles mitigantes, tomando como base los estudios técnicos que se llevarán a cabo por la presente consultoría.

6. Gestión de Riesgos: Asesoramiento para la elaboración de la matriz de riesgos del proceso licitatorio y análisis de los riesgos identificados para la contratación, así como los tipos de pólizas, garantías o seguros requeridos y las cláusulas aplicables para su mitigación. Igualmente deberá diseñar los mecanismos de mitigación, hará los respectivos análisis de contingencia y su valoración.

7. Gestión de Promoción: Asesoramiento en la promoción de la concesión que se deriven del Proyecto con los potenciales inversionistas, financiadores e interesados en general, para asegurar procesos competitivos y apoyará al Cliente durante las observaciones que tenga el mercado en la fase de licitación. Se aclara que IFC no hace parte del comité evaluador de los oferentes.

8. Gestión Jurídica: IFC elaborará y presentará el esquema jurídico básico del Proyecto, los riesgos de la implementación, los procedimientos y requisitos necesarios para la vinculación de capital privado que permitan cumplir con las actividades de estructuración jurídica de carácter financiero y comercial. También elaborará los documentos jurídicos necesarios para la formulación, estructuración e implementación del Proyecto.

2. Plazo del Contrato:

El plazo de ejecución del contrato será de 20 meses desde el día siguiente a la suscripción del Convenio, dividido en 4 fases (no necesariamente secuenciales) como se presenta a continuación:

La Fase 0- Plan de Trabajo y Metodología y tiene un plazo estimado de 2 meses.

- Actividad 1. Plan de Trabajo, cronograma y enfoque metodológico.

La Fase 1 – Ajustes y Gestión para El Convenio De Cofinanciación y tiene un plazo estimado de 1 meses.

- Actividad 2. Acompañamiento para la firma del Convenio de Cofinanciación

La Fase 2 – Ajuste Estudios Técnicos, Estructuración y Aprobaciones de la Transacción la cual contempla cinco Actividades y tiene un plazo estimado de 8 meses:

- Actividad 3. Ajustes y Complementos a los Estudios de Factibilidad
- Actividad 4. Revisión del esquema de Transacción
- Actividad 5. Estructuración Integral para el proceso de licitación
- Actividad 6. Estructura conceptual para la gestión e implementación del Proyecto.
- Actividad 7. Revisión técnica.

La Fase 3– Financiación, Promoción, Licitación y Cierre Comercial la cual contempla seis Actividades y tiene un plazo estimado de 10 meses:

- Actividad 8. Apoyo solicitud cupo de endeudamiento y preparación negociaciones con banca comercial y/o multilateral.
- Actividad 9. Aprobaciones para la apertura de los procesos de selección
- Actividad 10. Promoción del proyecto para licitación contrato principal
- Actividad 11. Proceso de selección y adjudicación del (de los) contrato(s) principal(es)
- Actividad 12. Proceso de selección de interventorías
- Actividad 13. Acompañamiento cierre comercial, hasta la firma del acta de inicio, e informe final

3. Lugar: El lugar de ejecución del Convenio será principalmente en Bogotá y en las zonas de influencia del Proyecto en el Departamento de Cundinamarca, Colombia.

4. Análisis que soporta el valor estimado del contrato, monto y posibles costos asociados al mismo

4.1. Marco legal de contratación de IFC

IFC gestiona con diversas agencias de donantes potenciales, fondos para sufragar parcialmente los gastos de contratación de las firmas consultoras que apoyarán en la estructuración del Proyecto (jurídico, técnico, ambiental-social y comunicaciones), sujeto al análisis, estudio y aprobación de manera independiente del grupo de donantes.

Considerando que el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.4.4.1. del Decreto 1082 de 2015, dispone que los convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, incluidos los recursos de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a estas operaciones, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades, el Convenio entre EFR, SMC e IFC se registrará por las normas de contratación de IFC.

Para el caso específico de este convenio al IFC contribuiría con el 60% de los recursos totales. El restante 40% quedará en cabeza de SMC y será transferido a la IFC en una sola cuota según los términos que se establezca en el Convenio.

4.2. Presupuesto del Convenio

Se estima que el presupuesto del Convenio será la suma de DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD \$2,062,000). Dicho monto se ha calculado teniendo en cuenta que el proyecto Tren de Zipaquirá ya cuenta con estudios de factibilidad adelantados por FINDETER en cumplimiento del objeto y alcance del Convenio No. 018 de 2019 (Numeración FINDETER), No. 048 de 2019 (Numeración de la Gobernación de Cundinamarca) y CE-048 de 2021 (Numeración IDU), el perfil y la experiencia de IFC como estructurador de proyectos de participación público privada a nivel regional y

global, la responsabilidad de las actividades que va a asumir, los riesgos inherentes al proyecto y su respectivo plazo.

El presupuesto presentado anteriormente es la suma de cada una de las siguientes componentes:

Actividades	VALOR
Gestión integral IFC	\$240,000
Jurídico	\$235,000
Comunicaciones	\$100,000
Financiero y Económico	\$245,000
Técnico, Socioambiental y Predial	\$1,242,500
TOTAL	\$2,062,500

Teniendo en cuenta lo estipulado en el literal 4.1, los aportes se dividen de la siguiente manera:

- **SMC:** Aportará Ochocientos veinticinco mil DÓLARES AMERICANOS (USD \$825,000), correspondiente al 40% del monto total indicado en el primer párrafo de este literal.
- **IFC:** Aportará UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS (USD \$1,237,500), correspondientes al 60% del monto total indicado en el primer párrafo de este literal.

4.2.1. Componente IFC

IFC pone a disposición un equipo experto en aspectos financieros, legal, técnico, ambiental, social y de biodiversidad, así como el acceso a una red global de profesionales expertos en diferentes áreas a quienes se podrá consultar cuando el Proyecto lo amerite. En complemento, también existen profesionales soportando al equipo de estructuración de IFC que no se encuentran vinculados directamente al Proyecto (indirectos) como son las áreas de contratación, finanzas, recursos humanos, tecnología, relación con donantes (incluyendo su respectivo reporte), y portafolio entre otros. A continuación, se presenta la dedicación estimada de los profesionales vinculados directamente al Proyecto:

Staff		Dedicación
Líder Equipo Región Andina y Cono Sur	Porcentaje	10%
Líder del Proyecto	Porcentaje	25%
Asociado	Porcentaje	30%
Analista	Porcentaje	30%
Líder socioambiental	Días	45.00
Especialista social	Días	35.00
Especialista Biodiversidad	Días	35.00
Especialista técnico internacional	Días	35.00
Especialista legal	Días	35.00
Especialista técnico local	Días	35.00

El equipo de IFC directamente vinculado al Proyecto se divide en 4 grandes materias: legal, técnica, socioambiental y financiera. Esto permite que la gerencia del Proyecto se realice con profesionales especialistas en cada materia y mejore las coordinaciones con los consultores.

4.2.2. Componente Jurídico:

Para IFC es indispensable que las firmas consultoras aporten experiencia nacional e internacional, elementos que se tienen en cuenta a la hora de su evaluación. Durante el proceso de contratación, se pueden presentar firmas individuales o consorcios de firmas internacionales con firmas locales. Adicionalmente, se solicita un equipo multidisciplinario que apoye en toda la estructuración del Proyecto en materias como: contratación estatal, financiación, seguros, predial, socioambiental, entre otros. Los términos de referencia solicitan que exista al menos un líder internacional y un líder local. Dichos líderes deberán contar con más de 10 años de experiencia en transacciones de APP, experiencia en contratación estatal, asesoría a gobiernos, y experiencia en proyectos similares de infraestructura férrea.

El número total de abogados varía entre proyectos, sin embargo, el promedio de abogados que participan en los proyectos asciende a 10 personas en cada Fase del Proyecto, siendo la Fase 2 la que mayor dedicación tiene por personal.

A continuación, se presenta una tabla con los honorarios del mercado para los consultores jurídicos, basado en la experiencia de IFC en la contratación de consultores jurídicos para el acompañamiento de estructuraciones de APP. Dichos honorarios incluyen costos de viaje, viáticos y demás costos indirectos, mediante un contrato tipo precio global fijo:

Cargo	Fee diario (en USD)
Socio internacional	7,000
Asociado internacional	4,500
Socio local	2,500
Asociado local	800

4.2.3. Componente de comunicaciones:

La participación de los actores sociales es fundamental para el establecimiento de relaciones sólidas, constructivas y adecuadas que son esenciales para la gestión acertada de los impactos ambientales y sociales de un proyecto (ND1). Dado lo anterior, una parte relevante de la implementación de las Normas de Desempeño de IFC, son las partes interesadas (*stakeholders*) del Proyecto. Este consultor es contratado por IFC, bien sea consultor firma o por medio de especialistas, para acompañamiento en la identificación de las partes interesadas del Proyecto, la estructuración del plan de comunicaciones, y diseñar el plan de partes interesadas en el Proyecto que deberá ejecutar después el Concesionario o la Entidad Concedente.

Se estima una participación total de 35 días de trabajo en Fase 2 y Fase 3 distribuido entre los diferentes miembros del consultor, conformado por un equipo entre 4 y 5 profesionales. A continuación, se presenta una tabla con los honorarios del mercado para los consultores de comunicaciones, basado en la experiencia de IFC en la contratación de este tipo de consultores para el acompañamiento de estructuraciones de APP. Dichos honorarios incluyen costos de viaje, viáticos y demás costos indirectos, mediante un contrato tipo precio global fijo:

Cargo	Tarifa diaria (en USD)
Partner	3,344
Director Senior	2,400
Consultor Experto en <i>Stakeholder Engagement Plan</i>	1,024
Líder Comunicaciones	1,024
Cosultor Junior	488

4.2.4. Componente Técnico y Socioambiental:

El consultor técnico y socioambiental, estará a cargo de los estudios de ingeniería y diseño de la concesión. Dentro de su alcance se encuentra la revisión de información existente del proyecto, la actualización del estudio de demanda y tránsito, los diseños del reemplazo de talle ANI y de nuevas estaciones, verificación del Material rodante y Plan de operación, afectaciones a Bienes de interés Cultural, actualización de redes, actualización predial y el estudio socioambiental. Lo anterior incluye un revisor técnico para los estudios de redes, Reemplazo Taller ANI y Estudios de ruidos y Vibración. Basado en los estudios de ingeniería y socioambientales, el equipo de IFC, con el apoyo de los consultores deberá estimar las necesidades de CapEx y OpEx, realizar el estudio de cambio climático, el análisis costo – beneficio, modelos financieros, cuantificación de contingencias, diseña los parámetros de niveles de servicio aplicables al nuevo concesionario y desarrollar los documentos de la licitación. Para llevar a cabo estas actividades, se plantea el uso de consultores especializados por actividad por lo cual se realizaron cotizaciones y estudios de mercado que arrojaron los siguientes valores.

Consultor	Valor (USD)
Demanda	103.500
Redes*	60.000
Material Rodante y Modelo Operacional	60.000
Diseños Taller ANI y estaciones *	300.000
Estructuración técnica y soporte transversal	201.000
Estudio de ruido y vibraciones*	102.000
E&S	250.000
Predial	56.000
Financiero, socioeconómico y riesgos	245.000
Análisis de la transacción	60.000
Revisión Técnica (ítems con *)	50.000
Total	1.487.500

El monto de indicado incluye los documentos técnicos de la estructuración del proyecto y los costos de acompañamiento en la Fase 3 de la promoción y licitación del Proyecto. Los consultores son contratados

con un tipo de contrato a precio global fijo siguiendo las normas de contratación del Grupo Banco Mundial. IFC, siendo el único responsable por el cumplimiento de las actividades a pactar en el Convenio de Asesoría Técnica, definirá e implementará las contrataciones de los consultores que considere procedente para el cumplimiento de dichas actividades.

4.3. Monto calculado para el horario de éxito del Convenio (Prima de Éxito)

Se refiere al valor que será reconocido a IFC por la adjudicación del Proyecto. El pago de comisiones asociadas al cierre de transacciones es una práctica común en diferentes sectores, incluyendo el de Infraestructura, y tiene como principal objetivo compartir el riesgo con el estructurador y generar incentivos para que este genere una estructura sólida que logre el éxito del proyecto. A continuación, se presenta una tabla resumen de las comisiones de éxito de proyectos APP en Colombia:

Proyecto APP	Valor Contrato	Comisión Éxito	Comisión Éxito/Valor Contrato
CARTAGENA- BARRANQUILLA	1,709,365	11,664	0.68%
CONEXIÓN NORTE	1,300,274	1,998	0.15%
HONDA-GIRARDOT	1,465,609	4,864	0.33%
MAGDALENA 2	1,740,428	1,998	0.11%
MULALÓ-LOBO	1,587,924	4,045	0.25%
PACIFICO 1	2,087,106	4,995	0.24%
PACIFICO 2	1,300,234	1,998	0.15%
PACIFICO 3	1,869,331	1,998	0.11%
PERIMETRAL DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA	1,647,176	5,222	0.32%
BUCARAMANGA- BARRANCABERMEJA-YONDO	3,764,221	4,000	0.11%
MAR 1	2,244,129	1,998	0.09%
MAR 2	2,514,121	1,998	0.08%
NEIVA-SANTANA	2,969,581	1,983	0.07%
POPAYAN- SANTANDER	1,702,181	1,667	0.10%
PUERTA HIE RRO	1,240,828	2,084	0.17%
TRANSVERSAL DEL SISGA	966,849	2,089	0.22%
VILLAVICECIO- YOPAL	2,939,321	2,089	0.07%
BUCARAMANGA- PAMPLONA	1,413,163	2,620	0.19%
MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA	3,000,591	4,000	0.13%
BUGA- LOBOGUERRERO - BUENAVENTURA	4,058,081	3,100	0.08%
SEDE FISCALIA CALI	476,589	2,698	0.57%
HOSPITAL DE BOSA	552,888	2,430	0.44%
REGIOTRAM DE OCCIDENTE	3,600,321	3,952	0.11%

Fuente: Elaboración propia a partir de Contratos APP

De acuerdo con las cifras de los 24 proyectos APP estructurados en Colombia, el promedio de la comisión de éxito ha sido de 0.20% sobre el Valor del Contrato.

En este sentido, en virtud del proceso de promoción, licitación, exitosa adjudicación, firma del Contrato de Concesión, o firma de Acta de Inicio del Contrato de Concesión, según se establezca en los documentos del

Proyecto, derivado de la estructuración integral objeto de la consultoría, que se causará a favor de IFC el derecho al reconocimiento, por parte del Concesionario Adjudicatario, de una Comisión de Éxito correspondiente a la suma de DOS MILLONES DE DOLARES AMERICANOS (USD \$2,000,000.00), en fondos inmediatamente disponibles, sin ningún tipo de deducción por impuestos, derechos de aduana, gravámenes u otras retenciones (todos los cuales deberán ser asumidos por el Concesionario Adjudicatario).

Teniendo en cuenta que con la información existente el valor del Proyecto es de aproximadamente US\$3,000,000,000 el valor de la prima de éxito es inferior al 0,20% promedio, están en el orden del 0,07%. De igual forma la prima de éxito solicitada de USD \$2,000,000, equivalente al 0,07% del valor estimado del contrato es inferior a la pactada en Regiotram de Occidente que fue del 0,11%.

SMC y EFR deberán asegurar que los pliegos de condiciones de la licitación y el Contrato de Concesión deberán estipular expresa e irrevocablemente que el pago de la Prima de Éxito por parte del Concesionario Adjudicatario a la IFC se deberá realizar como condición previa a la fecha en la cual se firma el Contrato de Concesión o, en el caso de que el Contrato de Concesión prevea la suscripción de un Acta de Inicio como etapa previa para el inicio del Proyecto, como condición previa a la firma de dicha Acta de Inicio, y la EFR compromete a no firmar el Contrato de Concesión o el Acta de Inicio, según sea el caso, hasta que el pago de la Prima de Éxito haya sido realizado.

TREN DE ZIPAQUIRÁ

Asesoría Transaccional IFC



Junio, 2025

DISCLAIMER

Este documento comercial es propietario y solo para uso confidencial. International Finance Corporation (“IFC”) lo emite únicamente para que lo utilicen los destinatarios y sus asesores. No puede reproducirse ni distribuirse total o parcialmente, ni divulgarse ni compartirse con terceros sin el consentimiento previo por escrito de IFC. Ninguna otra persona ha sido autorizada a dar información o hacer declaraciones con respecto al Proyecto descrito en este documento y, si se proporciona o se hace, no se debe confiar en dicha otra información o representaciones.

No se hace ninguna representación, garantía o compromiso (expreso o implícito) e IFC no acepta ni aceptará ninguna responsabilidad en cuanto a la idoneidad, precisión, integridad o razonabilidad de la información contenida en este documento comercial. La información contenida en este documento puede ser modificada o reemplazada por IFC en cualquier momento, sin previo aviso o sin dar ninguna razón. Nada de lo aquí incluido o adjunto es, o puede ser considerado como una promesa o representación en cuanto al desempeño futuro o a las políticas del Proyecto, ni debe ser considerado como una recomendación de IFC para participar en el Proyecto. Por el presente, se renuncia a cualquier responsabilidad en relación con el uso por parte de cualquier destinatario de la información contenida en este documento. El presente documento comercial solo será oficial una vez se surtan los trámites de aprobación por parte de la gerencia de IFC.

Servicios de asesoramiento y experiencia de IFC en transacciones APP

25 años de experiencia asesorando a gobiernos sobre APP en mercados complejos y fronterizos y es el mayor inversor multilateral en los sectores privados de sanidad y educación

¿Por qué IFC?

Conocimiento del mercado mundial y experiencia como asesor e inversor

Objetividad y transparencia en las transacciones

350 proyectos desde 1989

Socio neutral equilibrando objetivos de autoridades públicas e inversionistas



¿Qué ofrece IFC?

Asesoramiento en transacciones a gobiernos, ciudades e instituciones públicas

Transacciones pioneras en mercados y sectores fronterizos

Riesgo compartido y compromiso a largo plazo

Enfoque social y ambiental

¿Qué se propone?



Estructuración e Implementación



Monitoreo



Reforma Regulatoria


Relacionada con proyectos

Asesoría para estructurar una transacción de Participación Público Privada para el Tren de Zipaquirá



Gestión Cofinanciación

- Acompañamiento en la gestión del proceso de cofinanciación – Asistencia para atender los requerimientos durante esta etapa.
- Se da continuidad a asesores para facilitar gestión de la cofinanciación y para actualizar algunos componentes de los estudios de factibilidad. IFC asumió apoyo durante el aval técnico como parte de la preparación del Convenio.
- Recolección, revisión y validación de toda la información existente del proyecto.



Estructuración

- Complemento o actualización estudios de factibilidad (Demanda, redes, material rodante, nuevas estaciones (hasta 3), modelo de transacción, gestión predial)
- Estudio socioambiental aplicando las Normas de Desempeño de IFC
- Estructuración integral que permita dar cumplimiento a los requisitos para la apertura del proceso de licitación.
- Apoyo gestión del financiamiento de la EFR (operaciones requeridas previo a la adjudicación del proyecto).
- Proceso de promoción del proyecto.
- Borradores de documentos de licitación (Pliegos y Contratos).



Proceso de Adjudicación

- Gestión de observaciones y modificaciones a los documentos de licitación de la Transacción PPP y la Interventoría.
- Respaldo como asesor líder en la interacción con el mercado.
- Apoyo en el proceso de selección de la Interventoría Integral.



Cronograma optimizado

- Plazos según el proceso de aprobación acelerado indicado por la nación
- Gestión diligente del acuerdo de cofinanciación
- Articulación anticipada para facilitar proceso de gestión del financiamiento del Ente Gestor
- Oportuna apertura Proceso de Licitación


Ventajas de contratar al equipo de Asesorías de IFC

- Contratación directa, IFC aportando mas del 50.1% del valor del contrato
- Honorarios exentos de IVA
- Asesoría integral (técnica, socioambiental, legal, financiera, riesgos). IFC como estructurador líder integrador
- Equipo multidisciplinario con presencia regional y capacidad para acceder a la red global de IFC y WBG
- Involucramiento temprano de las multilaterales, evaluando soluciones de financiación

Esquema del Cronograma general

Fase 0, 1 y 2 ~ 10 meses Definición Estructura

Fase 2 ~ 10 meses Implementación

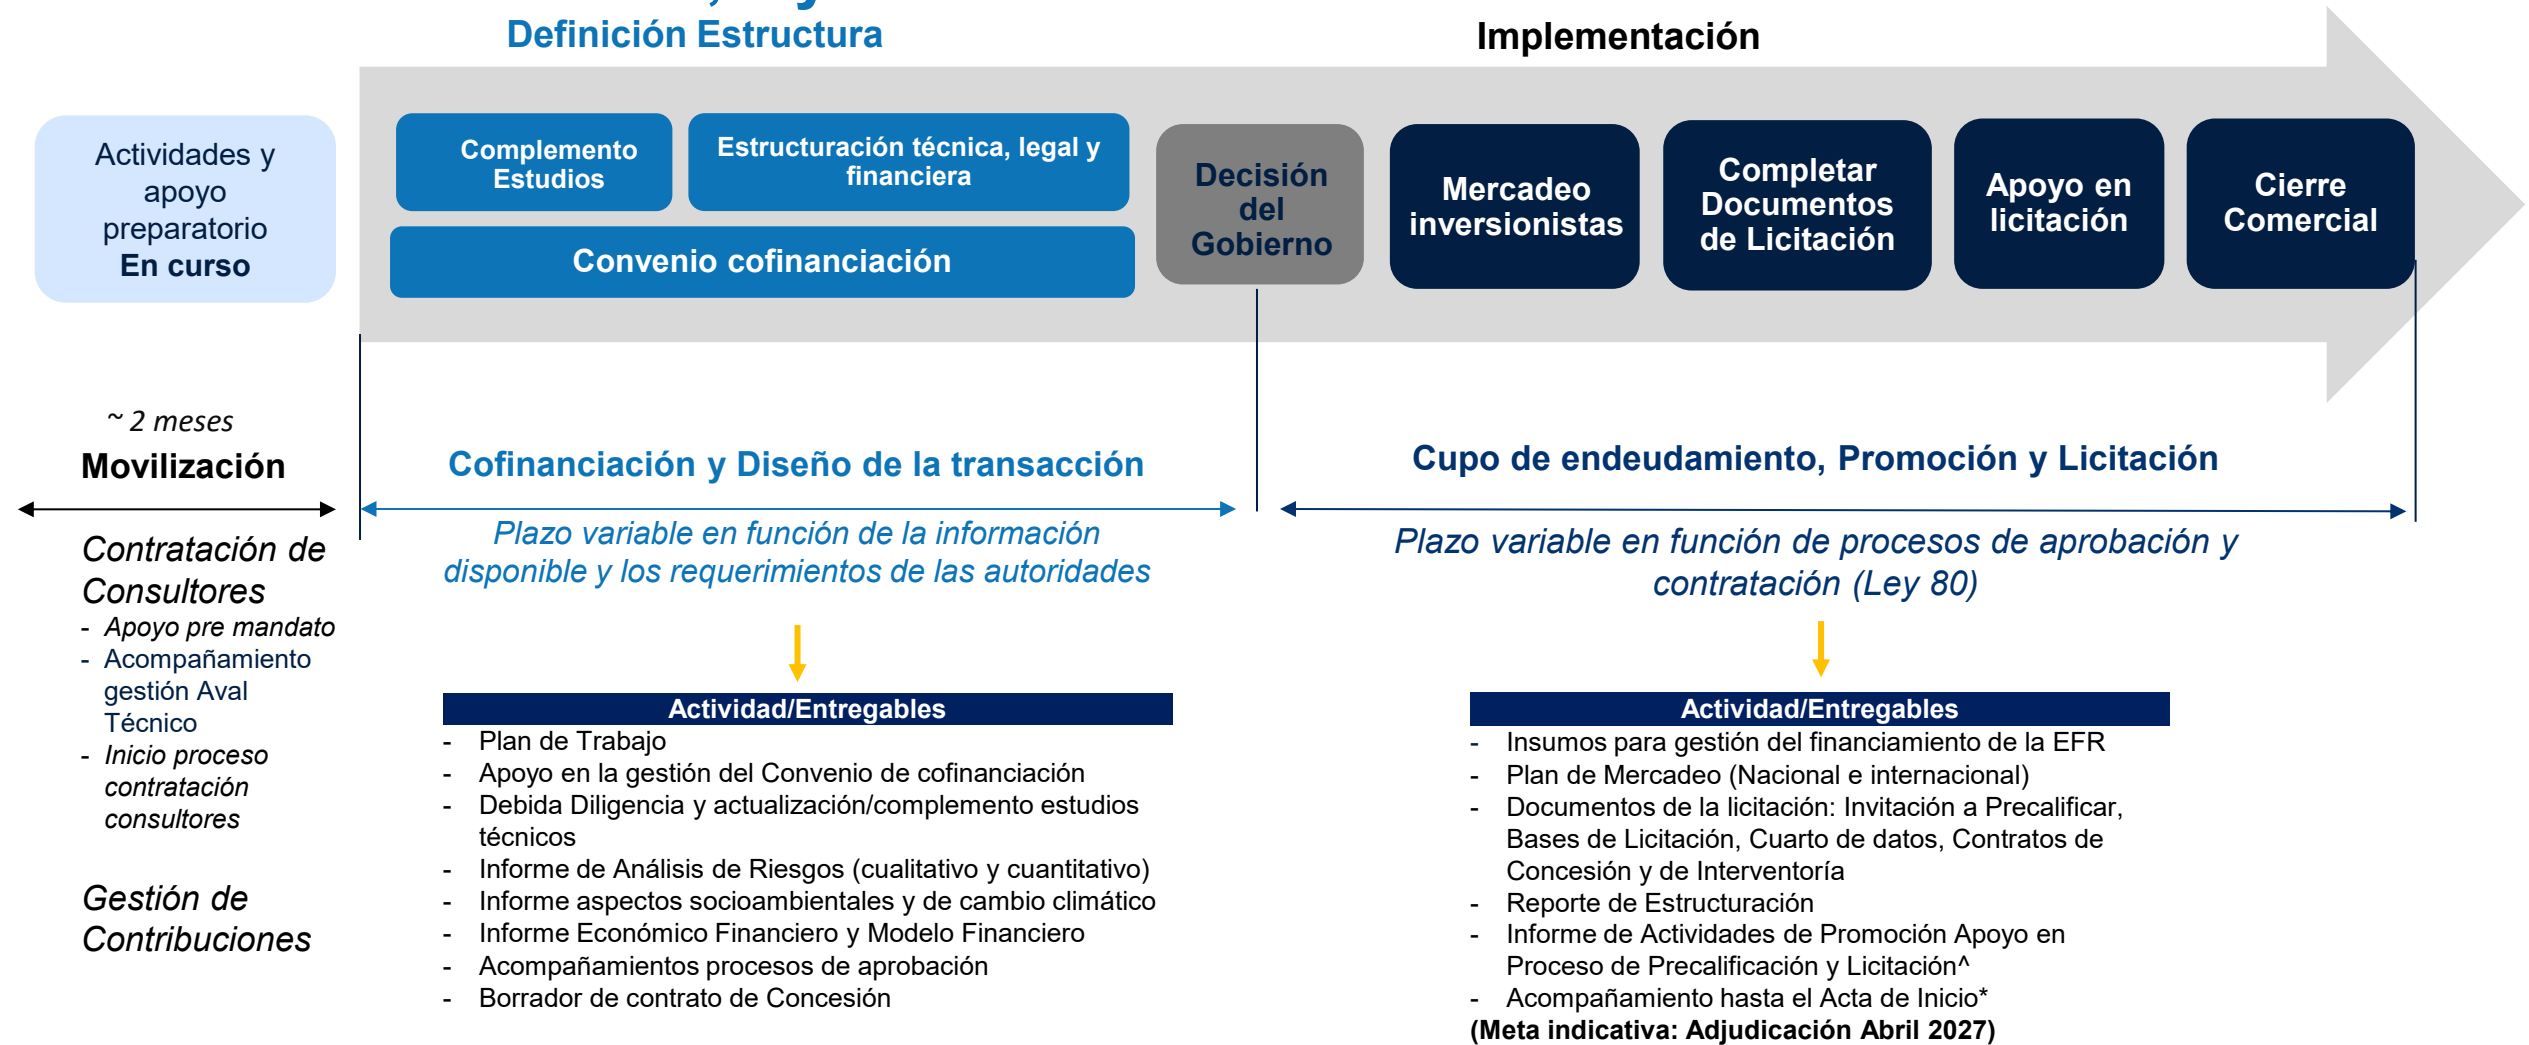

5

^ Respuesta a observaciones e insumos de adendas. No incluye participación en la evaluación.
* Para el contrato de la transacción PPP y de la interventoría. Comprende gestión de consultas. No incluye documentación para la formalización del Acta de Inicio.

Propuesta de Honorarios

IFC podrá gestionar con diversas agencias de donantes potenciales, fondos para sufragar parcialmente los gastos de contratación de las firmas consultoras que apoyarán en la estructuración del Proyecto (jurídico, técnico, ambiental-social y comunicaciones), sujeto al análisis, estudio y aprobación de manera independiente del grupo de donantes.



Honorarios Fijos*

A ser divididos entre el cliente (40%) y la IFC (60%).



Valor de Contrato:

US\$ 2,062,500

Los honorarios serán distribuidos entre los consultores (técnico, legal y socioambiental y comunicaciones), asesores de apoyo (técnico y legal) y el costo del personal y gestión de IFC.



Forma de Pago

Se adapta según la disponibilidad de recursos del cliente. Puede ser por entregables o desembolsos según fecha de la disponibilidad presupuestal.



Comisión de éxito

A ser pagados por el adjudicatario.
Total US\$2,000,000

* Asume un alcance técnico acotado dada la evolución de la gestión del aval técnico.

Condiciones Precedentes al contrato de asesoría

El trabajo de la IFC con el Cliente se formaliza con la firma de un convenio que indicará los servicios a prestar, los costos asociados, los tiempos estimados, esquema de gobernanza, y los derechos y obligaciones de las Partes. Para llegar a la firma de este convenio nos permitimos resaltar aspectos preliminares importantes.

- **Entidad Contratante de la Estructuración:** Definición de la entidad que tenga la capacidad legal y presupuestal y que represente a la Gobernación en la suscripción del convenio de asesoría para la estructuración del Proyecto con IFC .
- **Recursos para la asesoría:** Se debe confirmar la disponibilidad presupuestal para pagar los servicios de asesoría indicados en el Convenio.
- **Importancia estratégica del proyecto y apoyo:** Se debe validar la importancia estratégica del Proyecto para las autoridades y su fehaciente apoyo desde el más alto nivel.
- **Capacidad fiscal de la Entidad Concedente:** Se debe confirmar preliminarmente, que se cuenta con el espacio fiscal para sufragar los pagos relacionados con la remuneración del concesionario que ejecute el Proyecto.
- **Coordinación con Otras entidades:** Se deberá confirmar que se cuenta con un proceso de toma decisiones, liderazgo y disposición de equipos multidisciplinarios entre las entidades involucradas en el proceso de estructuración y licitación del Proyecto.

Anexos



IFC

**International
Finance Corporation**
WORLD BANK GROUP

Situación Actual

Generalidades

- Creciente aumento del número de personas (+3%) en los últimos 5 años en la Ciudad de Bogotá.
- Si bien la ciudad y la región han trabajado en el desarrollo de soluciones de transporte masivo tales como Transmilenio que operan desde el 2000 y en la implementación de un sistema de metro (1ra línea bajo construcción), se requiere un sistema que proporcione soluciones de movilidad en el área metropolitana y poblaciones cercanas.

Armonización con otros proyectos (en marcha y futuros)

- Regiotram de Occidente y la primera línea del metro bajo construcción
- En preparación soluciones complementarias como la tercera línea del metro y metro cables.
- Mejoramiento de la seguridad y accesibilidad a sistemas de movilidad



Planes de acción

- Plan de Ordenamiento de la Ciudad (2022-2035) define un modelo de movilidad sostenible que permita la descarbonización del sistema.
- Diseñar un plan a largo plazo que permita la operación, mantenimiento y mejora de los sistemas de movilidad a través de una APP

Alcance del Proyecto


Diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de 48.9 km de un sistema férreo iniciando en el PK 05+000 del corredor Bogotá-Belencito hasta La Caro, donde se desvía hacia el corredor férreo La Caro - Zipaquirá hasta el actual PK 54+400.

Implementar soluciones estructurales en las zonas de cruces urbanas donde hay cruces viales importantes, esto incluye la construcción de túneles y puentes en la zona urbana de Bogotá.

Inversión inicial esta alrededor de los US\$2.5 billones, teniendo en cuenta tanto las intervenciones en el corredor como en las estaciones, diseño urbanístico y material rodante entre otros

BENEFICIOS

- Mejorar la movilidad de la población de la ciudad de Bogotá y los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá, para aproximadamente 1 millón de personas .
- Reducir los tiempos de desplazamiento
- Sistema de transporte con un menor impacto ambiental, más seguro y eficiente en su consumo de electricidad.
- Garantizar la sostenibilidad del sistema férreo de la ciudad y región en el largo plazo

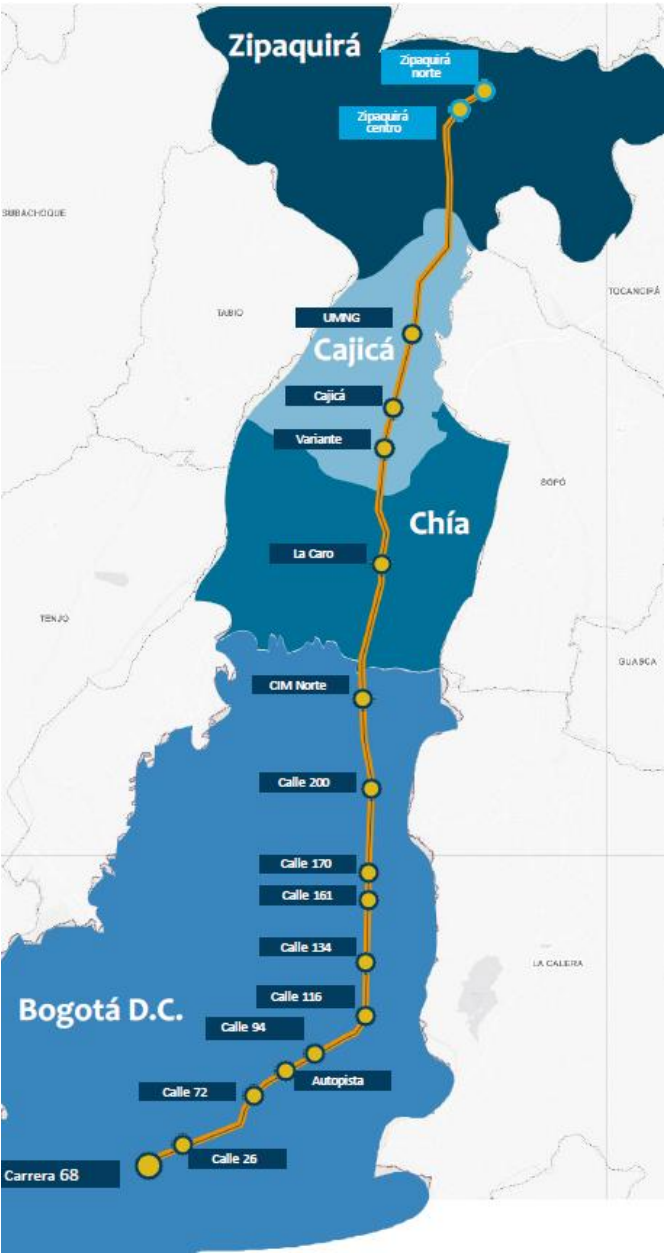


Fuente: Gobernación de Cundinamarca

Objetivo de proyecto y del contrato de concesión



- #1** Acceso a fuentes de financiación privada
- #2** Acceso a mejores prácticas de la industria a nivel mundial
- #3** Mejora en estándares de calidad y servicio
- #4** Compromisos presupuestales estables y predecibles en el largo plazo
- #5** Valor por Dinero y eficiencias del proceso de selección competitivo
- #6** Adecuada distribución de riesgos

Potencial esquema de la ejecución de la Transacción APP

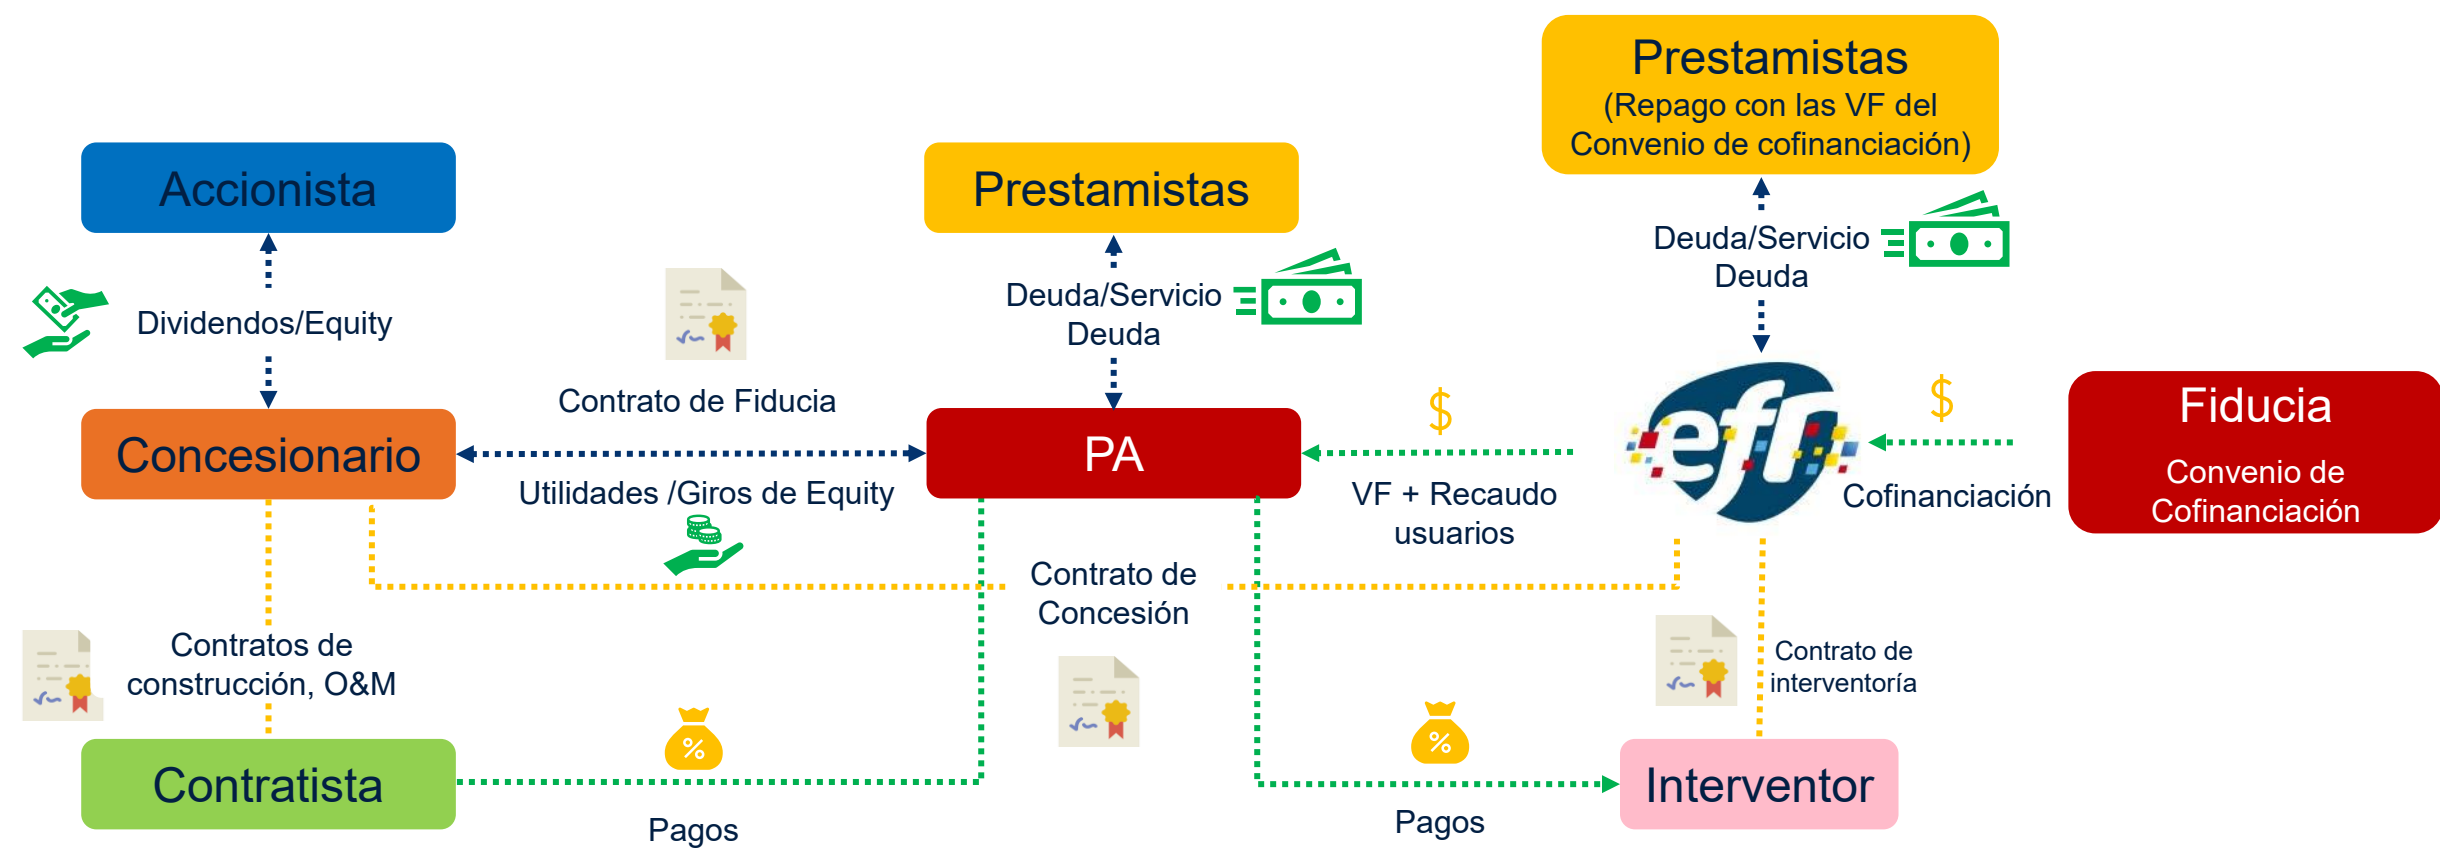

PA: Patrimonio Autónomo

Confidencial

Etapas Contractuales (Post firma de Adjudicación del Contrato)

En una Transacción PPP aplicable para este proyecto típicamente se tiene en consideración las siguientes etapas contractuales

